Alstahaug kommune

PROSESSPLAN/PROSJEKTPLAN

for

Arbeidet med forvaltningsplan for Åsen i Sandnessjøen

September 2013

Prosessplan vedtatt av: Planutvalget den 19.09.13, sak 35/13
Prosessplan sist endret den:
Endringene foretatt av:

BAKGRUNN OG PROBLEMSTILLING

Åsen i Sandnessjøen er et viktig grøntområde og sentralt friluftsområde som er mye brukt i dag. Det er imidlertid et stort behov for bedre tilrettelegging og skjøtsel.

Satsning på Åsen er forankret i Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum som et eget innsatsområde. Innsatsområdet har følgende delmål: " Det skal jobbes med å utnytte potensialet som Åsen har som grøntområde i sentrum." og "Utsiktspunkter i Åsen skal tilrettelegges, og det skal fokuseres på krigshistorien." Tiltak knyttet til disse delmålene er følgende: "Det igangsettes arbeid med en forvaltningsplan for Åsen med fokus på skjøtsel, bevaring av kulturminner og tilrettelegging for fysisk aktivitet for allmennheten." Videre er Åsen høyt prioritert i kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse.

Nordland fylkeskommune har, i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, satt i gang en storstilt satsning på skilting og merking av turløyper ut fra reiseliv, folkehelse og friluftsliv. Det er kanalisert midler gjennom Helgeland Friluftsråd knyttet til dette i denne regionen. Det er gitt tilsagn om midler til skilting og merking av Åsen i forbindelse med denne satsningen. Sentralt i planarbeidet vil derfor være et samarbeid med Helgeland Friluftsråd knyttet til skilting og merking.

Målsettingen er at Alstahaug skal bli en foregangskommune på Helgeland når det gjelder tilrettelegging for friluftsliv i nærområdene etter mal fra tilretteleggingsprosjektet i Bodø.

MÅL

FORMÅL

Det skal gjennomføres en planprosess, der det fokuseres på Åsens potensiale som rekreasjonsområde. Sentrale aktører som frivillige organisasjoner, grunneiere og gårdbrukere samt administrasjon og politikere i Alstahaug kommune skal delta i prosessen.

Planarbeidet skal være handlingsrettet og det skal fokuseres på følgende:

- Skilting og merking
- Standard på stiene både hovedstien og adkomststier/veger
- Utsiktspunkter
- Krigshistorie
- Benker og bord
- Skjøtsel av skog
- Beiting og gjerding
- Design på skilting, merking og utstyr
- Tilrettelegging av innfallsportene
- Universell utforming for deler av Åsen

Planarbeidet skal danne grunnlag for kostnadsberegning av tiltak med tanke på budsjettarbeid og søknad om eksterne midler.

RESULTATMÅL

I løpet av høsten 2013 og våren 2014 skal det være utarbeidet en plan for kortsiktige tiltak knyttet til skilting og merking av Åsen. Det skal lages en langsiktig plan for skjøtselstiltak, opparbeiding av stier og turveger samt andre tiltak.

INTERESSESENTER

Helgeland Friluftsråd er sentral med tanke på finansiering av merking og skilting.

- Frivillige organisasjoner som Åsen Vel, Sandnessjøen Idrettslag, Sandnessjøen Turistforeningen, NROF
- Administrasjon i Alstahaug kommune ved bl.a. plansektor, kommunalteknisk sektor, landbruks – og miljøvernsektor, kultursektor, folkehelsekoordinator, Frisklivssentralen
- Skoler og barnehager i Sandnessjøen
- Politiske partier og politiske utvalg som naturressursutvalget i Alstahaug kommune
- Grunneiere og gårdbrukere

ORGANISERING AV ARBEIDET

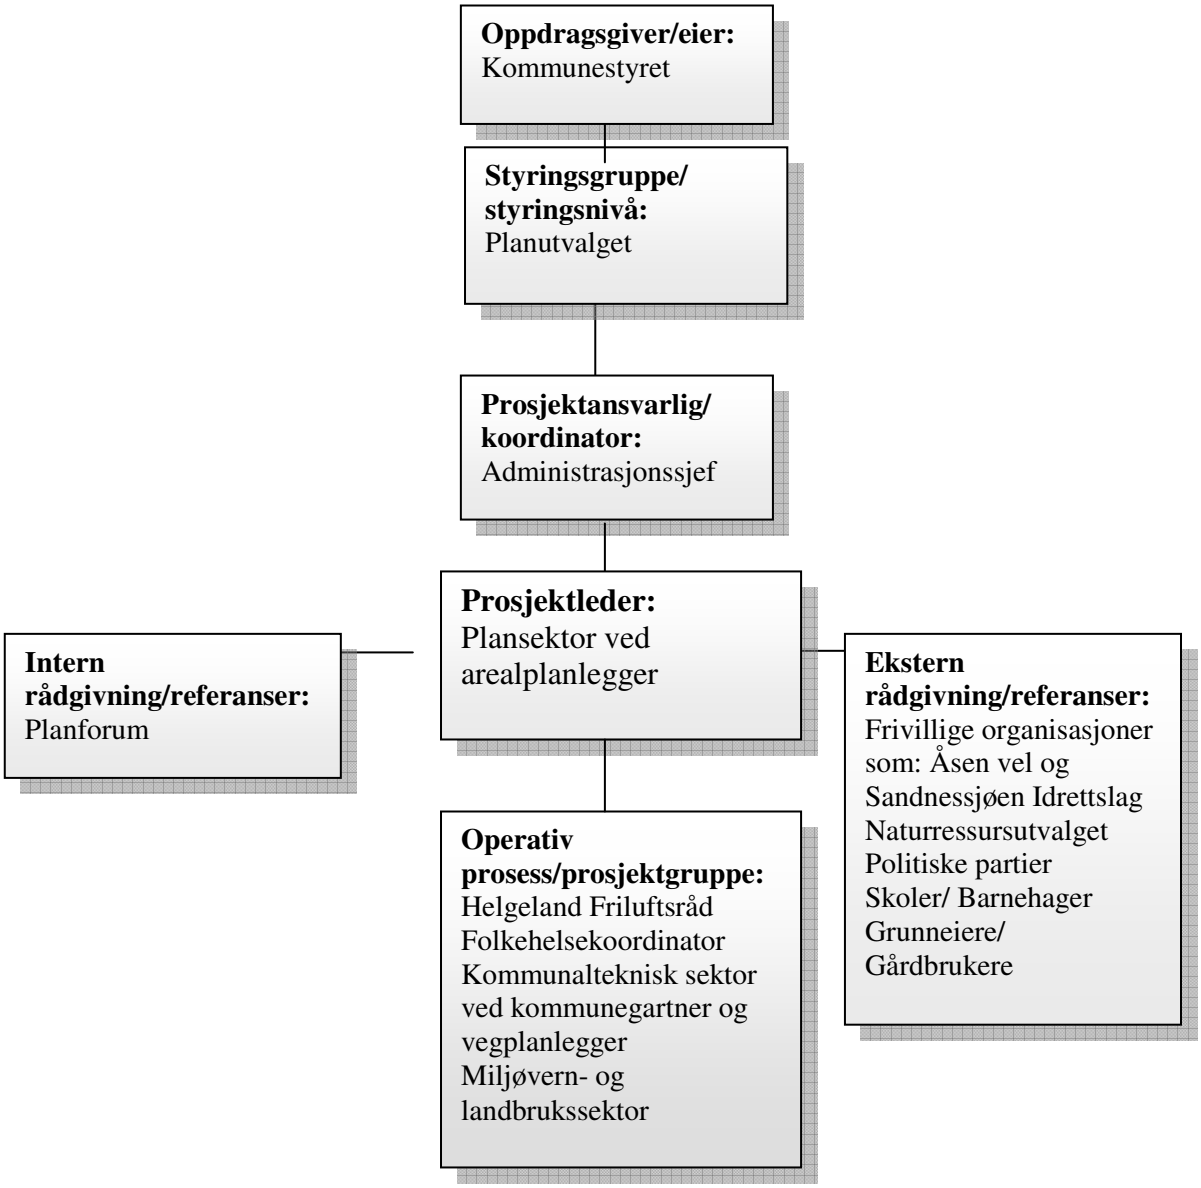

ROLLEBESKRIVELSE

Det forutsettes at Alstahaug kommune ved administrasjon skal spille en aktiv rolle i planarbeidet. Frivillige lag og foreninger inviteres til å delta i prosessen. Kommunestyret er eier av prosjektet, da det er forankret i overordnete planer. Planutvalget, som har delegert ansvaret for plansaker, vil fungere som styringsgruppe for prosjektet. I den operative prosjektgruppa vil Helgeland friluftsråd delta.

Framdriftsplan

Hovedformål	**Aktivitet**	**Arbeidsmåte/ Arbeidsform**	**Aktører** A: Ansvar I: Involveres	**Milepæl eller tidsrom**
Innhenting av kunnskaper om status og potensiale	Møter og befaringer etter nærmere framdriftsplan	Registreringer og befaring i samarbeid med Helgeland Friluftsråd	A: Prosjektleder og I: Prosjektgruppe og Helgeland Friluftsråd	Sept. 2013
Oppnå politisk forankring av planarbeidet	Beskrivelse av prosessen og målsettinger med arbeidet	Informasjon og sak til planutvalget som styringsgruppe	A: Prosjektgruppe I: Planutvalget	Sept. 2013
Skape fellesforståelse for dagens situasjon	Verksted med inviterte parter	Swot-analyse (sterke og svake sider – trusler og muligheter)	A: Prosjektgruppe I: Inviterte deltagere	Nov. 2013
	Rapport/tilbakemelding til deltakerer om resultatet	Sammendrag av Lysark/flippoverark	A: Prosjektleder I: Prosjektgruppe	Nov. 2013
Prioritering og planlegging	Planarbeid	Møter og planarbeid	A: Prosjektleder I: Prosjektgruppe	Nov 2013 til mars 2014
Oppnå forankring av forslag til prioriteringer	Informasjonsarbeid	Bruk av kommunens hjemmeside og informasjonsmøte	A: Prosjektleder I: Prosjektgruppe	Mars 2014
Politisk forankring av prioriteringer	Informasjon om planlagte tiltak	Informasjon og sak til planutvalget	A: Prosjektgruppe I: Planutvalget	April 2014
Gjennomføring av tiltak i tråd med plan	Tiltaksarbeid		A: Prosjektgruppe I: Alstahaug kommune	Mai- Nov 2014

FRAMDRIFT/TIDSPLAN

Aktivitet / Tid	2013						2014						Ressursbehov dg/uke/mnd
	uke 34	38	42	46	48	50	52	04	08	12	16		
Kunnskapsinnhenting og møter samt politisk forankring	■	■	■	■	■								**3 ukesverk**
Prioritering og planlegging				■	■	■	■	■	■				**5 ukesverk**
Realisering av tiltak*													**2 ukesverk**
*Dette tidfestes ikke													

RESURSBEHOV OG FINANSIERING

RESURSBEHOV

Aktivitet/Formål	Personal-ressurser	Personal-Kostnader innleie/ frikjøp	Kostnader	Kommentarer
Møter og planarbeid samt deltagelse på kurs	3 ukesverk	4 ukesverk		
Gjennomføring av åpne arbeidsmøter samt annet utadrettet arbeid	1 ukesverk		100 000,-	
Realisering av tiltak:	2 ukesverk		150 000,-	Oppfølgingsarbeid og andre kostnader
(*)Kommunens personalkostnader på totalt 10 ukesverk			150 000,-	
Totalt			400 000,-	

(*)Kommunens personalkostnader på 10 ukesverk beregnes til kr 150 000,-

FINANSIERING

Finansieringskilde	Kostnader	Finansiering
Budsjettmidler	**281 000(*)**	**Budsjett**
Eksterne midler	**119 000***	**Tilskudd**
Totalt	**400 000,-**	

*Det er forutsatt at midlene som er bevilget til prosjektet kun skal brukes til innkjøp av materiell. Planlegging og arbeid i felt er forutsatt utført av prosjekteier som er Alstahaug kommune
(*)Kommunens personalkostnader på 10 ukesverk beregnes til kr 150 000,-

KRITISKE SUKSESSFAKTORER

Kapasiteten til kommunens ansatte når det gjelder å følge opp prosjektet er en utfordring. Det er videre avgjørende at det bevilges midler over budsjettet, da kommunal egeninnsats en forutsetning for å få eksterne midler.
